



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
มกราคม 2561

## 1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ป.ปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

## 2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 61-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

### 3. ผลการติดตามและประเมินผล


สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็น ร้อยละของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	รวม	ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ถึงกำหนด ดำเนินการ
สกก.*	10	10.42	1	8	6	2	1	-	1
กม.**	5	5.21	1	2	1	1	2	1	1
กส.	6	6.25	-	5	3	2	1	-	1
ขก.	8	8.33	-	7	1	6	1	1	-
คด. 1	5	5.21	-	5	1	4	-	-	-
คด. 2	5	5.21	-	5	2	3	-	-	-
คด. 3	5	5.21	-	4	1	3	1	-	1
คด. 4	5	5.21	-	4	1	3	1	-	1
คท.	8	8.33	3	-	-	-	5	4	1
นย.	20	20.83	2	14	10	4	4	4	-
บส.	4	4.17	-	4	3	1	-	-	-
ศท.	8	8.33	1	6	6	-	1	-	1
พบ.	1	1.04	-	1	1	-	-	-	-
สอ.	6	6.25	1	5	3	2	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100.00</b>	<b>9.38</b>	<b>72.91</b>	<b>40.62</b>	<b>32.29</b>	<b>17.71</b>	<b>10.42</b>	<b>7.29</b>


หมายเหตุ : \*มีการขอปรับแผนงาน 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 2 แผนงาน (สกก.)

\*\*มีการดำเนินการนอกแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาพอกเงินและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในเชิงบูรณาการ (กม.)


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน

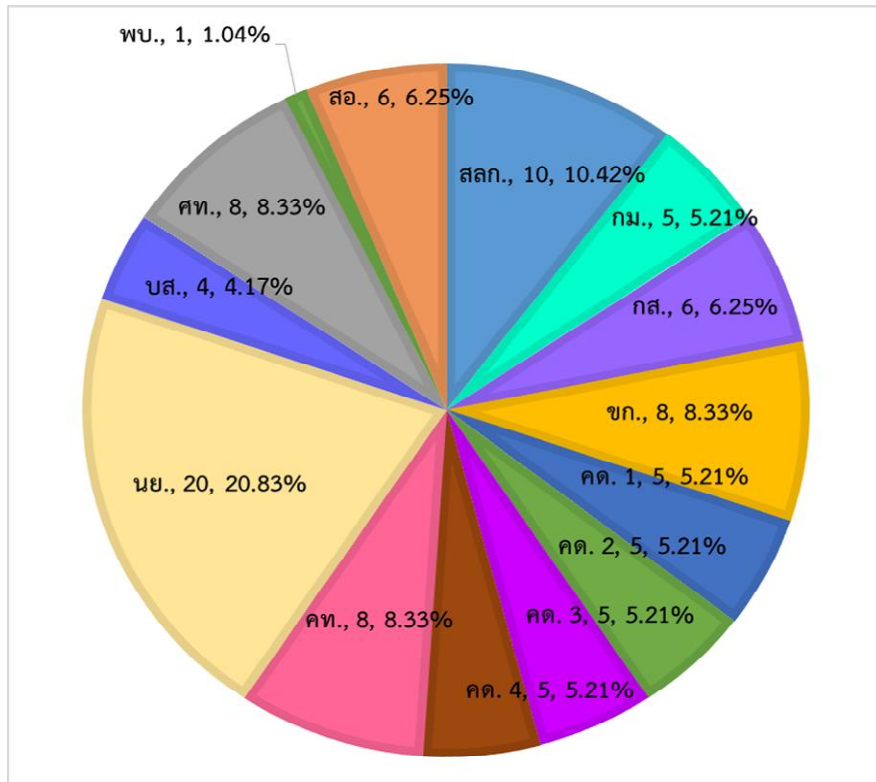


แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ธ.ค. 2560

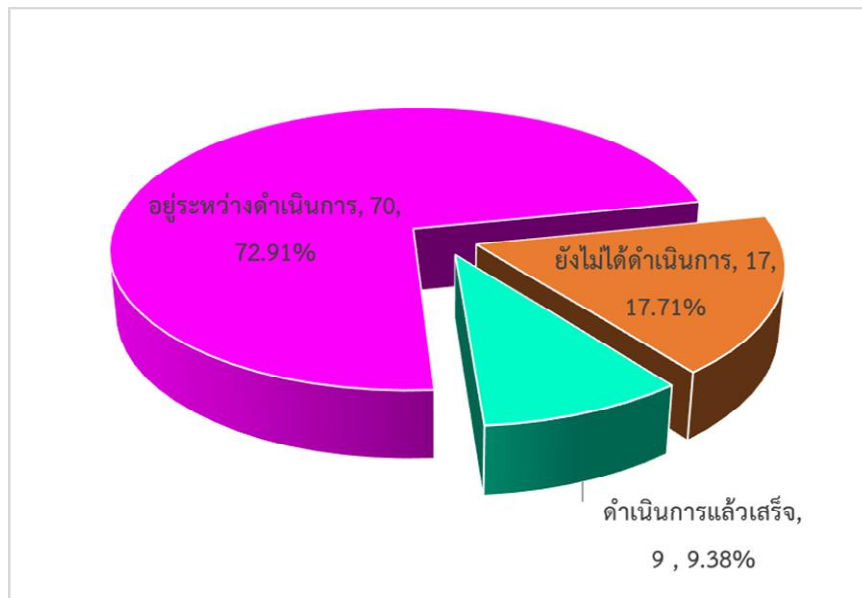

แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ฐ.ค. 2560

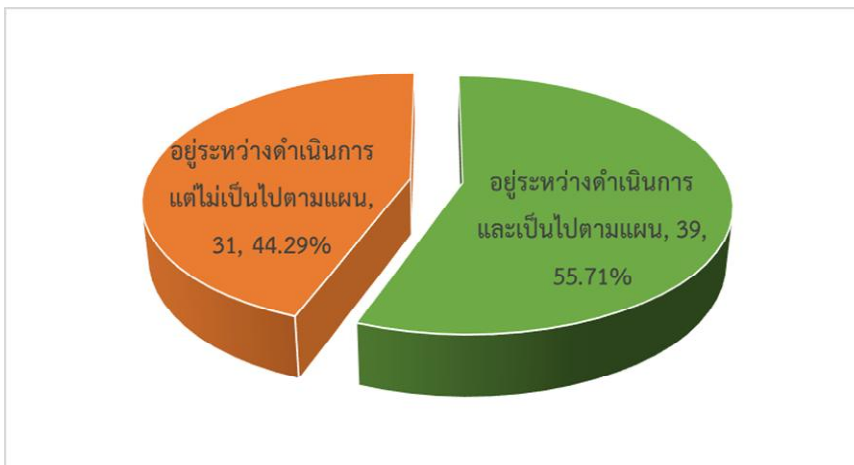

แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ ฐ.ค. 2560

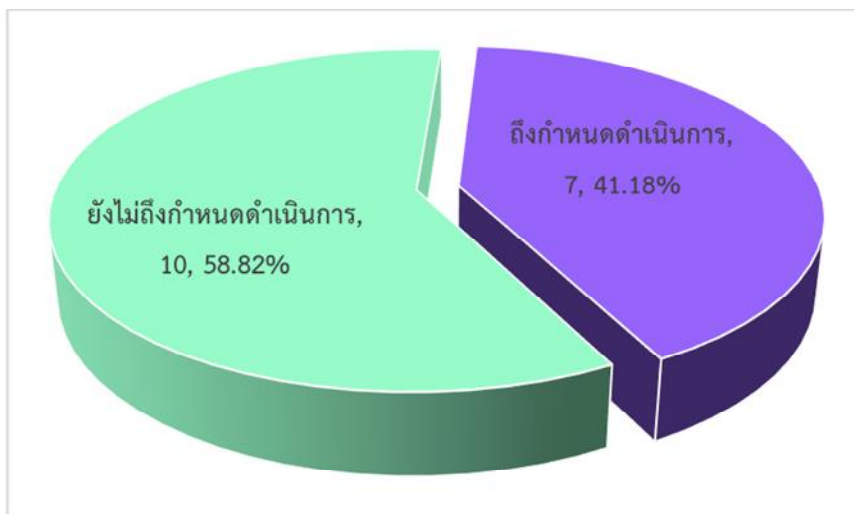

### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
<b>สำนักงานเลขาธิการกรม (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2561 - 2563 (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 47 คน ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างแผน ยุทธศาสตร์ฯ และจะประกาศใช้ แผนฯ ภายในเดือน ม.ค. 61	สนับสนุน ย.3
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัย แนวทางการป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ความ รับผิดทางละเมิดฯ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดทางละเมิดฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 100	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (3 แผนงาน)</b>			
1	โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวน สอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation) (1 ครั้ง/ระดับ 5)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 - 11 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 44 คน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้วิธีการสืบสวน สอบสวนเงินดิจิทัล ตลอดจนมีการ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการสืบสวน สอบสวนฯ และยกตัวอย่าง กรณีศึกษา	สนับสนุน ย.1
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง  2.1 สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564 (1 ครั้ง)	จัดสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กทม. มีผู้เข้าร่วมฯ 120 คน โดยมีการ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว	ยช.2 ศช.4.7 รบ.11.6 ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (การสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากฮ่องกงเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามความเสี่ยง) (1 ครั้ง/ระดับ 5)	เปลี่ยนชื่อเป็นการอบรมหัวข้อ Risk - based supervision โดยจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 84 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ากับสถาบันการเงินตามความเสี่ยงตลอดจนสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ยช.2 ศช.4.4 รบ.11.6 ย.1
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)</b>			
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล (1 ครั้ง/60 คน)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ย. 60 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 110 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปง. สามารถนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุน ย.3
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม	ยช.2 รบ.11.6 งปม.11



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
	<p>ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง/120 คน/ร้อยละ 96)</p>	<p>โครงการฯ 135 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อันนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการภาพรวม ร้อยละ 100</p>	<p>ย.1</p>
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)</b>			
<p>1</p>	<p>โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)</p>	<p>จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ แพลททินัม กทม. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 95 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99</p>	<p>สนับสนุน ย.3</p>
<b>กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)</b>			
<p>1</p>	<p>การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (จัดประชุม 1 ครั้ง)</p>	<p>จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการติดตาม</p>	<p>ย.3</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
		ประเมินผลของหน่วยงานฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	

### 3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 31 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 32.29 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
<b>สำนักงานเลขาธิการกรม (2 แผนงาน)</b>					
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 แผน/ระดับ 5)	3. จัดประชุม คณะทำงาน PMQA	2. จัดทำร่าง แผนปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	66.67	เจ้าหน้าที่มีการโอนย้ายฯ จึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนฯ โดยจะจัดประชุมคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. 61

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
2	การจัดทำแผนพัฒนา ความผาสุกและความ ผูกพันของข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงาน ป.ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 แผน/ระดับ 5)	3. จัดประชุม คณะทำงาน PMQA	2. จัดทำร่าง แผนพัฒนาความ ผาสุกและความ ผูกพันของ ข้าราชการและ พนักงานราชการ สำนักงาน ป.ปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	66.67	เจ้าหน้าที่มี การโอนย้ายฯ จึงมีการ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ใหม่ ซึ่งขณะนี้ ได้จัดทำร่าง แผนฯ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัด ประชุม คณะทำงานฯ ภายในเดือน ม.ค. 61
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>					
1	การบูรณาการจับกุม ผู้กระทำความผิด อาชญาฐานฟอกเงิน (ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (70 เป้าหมาย)	10 เป้าหมาย	4 เป้าหมาย	40.00	เป้าหมาย จับกุมได้ยาก มีการหลบ หนีสูง บางหมายจับ ถูกจับโดยชุด สืบสวนของ สถานีตำรวจ ที่รับผิดชอบ คดีนั้น และมี คดีที่อยู่ ระหว่างการ เสนอผู้บริหาร

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
					พิจารณา อนุมัติ จำหน่าย หมายจับซึ่งถูก ดำเนินการ จับกุมโดยชุด ปฏิบัติการอื่น นอกเหนือจาก ที่สำนักงาน ปปง. เสนอตั้ง สาย
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)</b>					
1	การตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (90 ครั้ง)	30 ครั้ง	5 ครั้ง	8.33	เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างการ ประเมินผล ความเสี่ยงใน ระบบ สารสนเทศ AMRAC จึงยัง ไม่มีการลงพื้นที่ ออกตรวจฯ
2	โครงการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความ เสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ	2 ครั้ง/218 คน/ ร้อยละ 96	ขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	มีข้อขัดข้องใน การประสาน สถานที่และ กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดจัด โครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	ร้าย และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มี านุภาพทำลายล้างสูง ให้ภาคธุรกิจ (3 ครั้ง/327 คน/ ร้อยละ 96)				26 ม.ค. 61 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กำหนดจัด เดือน ก.พ. 61
<b>กองข่าวกรองทางการเงิน (6 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงินและ กฎหมายอื่น				การดำเนินการ สืบสวน ปราบ ปรามฯ ขึ้นอยู่ กับปริมาณคดี ที่ ขก. ได้รับ ซึ่งคาดว่าจะ ดำเนินการได้ ตามแผนใน ไตรมาสที่ 2
	1.1 ตรวจสอบฯ (1,000 เรื่อง)	351 เรื่อง	326 เรื่อง	92.88	
	1.2 สืบสวนสอบสวนฯ (285 เรื่อง)	72 เรื่อง	29 เรื่อง	40.28	
2	โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี านุภาพทำลายล้างสูง				ต้องใช้ ระยะเวลาใน การสืบพยาน บางคดีใช้เวลา 3 เดือน เป็นต้น

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	2.1 ตรวจสอบฯ (85 เรื่อง)	30 เรื่อง	11 เรื่อง	36.67	
	2.2 ส่งรายชื่อให้อัยการยื่นคำร้องเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (30 เรื่อง)	11 เรื่อง	5 เรื่อง	45.45	
	2.3 อัยการยื่นคำร้องต่อศาล (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	100.00	
3	การวิเคราะห์รายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดี (ร้อยละ 21)	ร้อยละ 21	-	-	ในระหว่างปียังไม่คำนวณอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจะคำนวณอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นปีละครั้งในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
4	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน (150 เรื่อง)	53 เรื่อง	4 เรื่อง	7.55	ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
5	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน (35 เรื่อง)	13 เรื่อง	8 เรื่อง	61.54	ต้องใช้ ระยะเวลา ในการสืบสวน รวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อ นำเสนอต่อ คณะกรรมการ
6	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน (45 เรื่อง)	16 เรื่อง	5 เรื่อง	31.25	ธุรกรรม
<b>กองคดี 1 (4 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (ความผิด มูลฐานอื่น)				คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาด ใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ที่ เกี่ยวข้อง
	1.1 ส่งอัยการ 20 เรื่อง	6 เรื่อง	2 เรื่อง	33.33	หลายฝ่าย
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	ปริมาณ ภารกิจกับ อัตรากำลังที่มี

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	66.67	อยู่ไม่ สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.4 มีคำสั่ง ม. 72 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	13 เรื่อง/คำสั่ง	72.22	
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	1 คดี/เรื่อง	-	-	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 มีคำสั่ง ม. 37 เรื่อง/คำสั่ง	9 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	55.56	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	2.4 ส่งอัยการ 17 เรื่อง	4 เรื่อง	1 เรื่อง	25.00	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	3.1 มีคำสั่ง ม. 9 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	100.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/ รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				
	4.1 มีคำสั่ง ม. 11 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	
	4.2 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/ รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	4.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	4.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	
<b>กองคดี 2 (3 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม	-			คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาด ใหญ่ มีความ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	กฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				ซับซ้อน มีผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ปริมาณ ภารกิจกับ อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่ สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.1 ส่งอัยการ 14 เรื่อง	4 เรื่อง	2 เรื่อง	50.00	
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	19 เรื่อง/คำสั่ง	105.56	
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	1 คดี/เรื่อง	-	-	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายพอกเงิน				
	2.1 มีคำสั่ง ม. 38 เรื่อง/คำสั่ง	10 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	60.00	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 24 เรื่อง	8 เรื่อง	11 เรื่อง	137.50	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ตามกฎหมาย พอกเงิน				
	3.1 มีคำสั่ง ม. 8 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	
<b>กองคดี 3 (3 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาดใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ที่ เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ปริมาณ ภารกิจกับ อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่
	1.1 ส่งอัยการ 11 เรื่อง	3 เรื่อง	3 เรื่อง	100.00	
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	66.67	สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	38.89	
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	1 คดี/เรื่อง	-	-	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 มีคำสั่ง ม. 38 เรื่อง/คำสั่ง	10 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	30.00	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	14.29	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 27 เรื่อง	7 เรื่อง	10 เรื่อง	142.86	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	3.1 มีคำสั่ง ม. 11 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	100.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/ รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	3.4 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	
<b>กองคดี 4 (3 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)	-			คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาดใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ที่ เกี่ยวข้อง
	1.1 ส่งอัยการ 6 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	200.00	หลายฝ่าย
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	ปริมาณ ภารกิจกับ
	1.3 มีคำสั่ง ย. 13 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	-	-	อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	10 เรื่อง/คำสั่ง	55.56	สอดคล้องกัน ทำให้การ
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	1 คดี/เรื่อง	-	-	ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 มีคำสั่ง ม. 37 เรื่อง/คำสั่ง	9 เรื่อง/คำสั่ง	13 เรื่อง/คำสั่ง	144.44	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 32 เรื่อง	7 เรื่อง	3 เรื่อง	42.86	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	3.1 มีคำสั่ง ม. 9 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/ รายคดี	-	-	-	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)</b>					
1	การจัดทำยุทธศาสตร์ การวิจัย (9 ขั้นตอน)	3. ประชุม คณะทำงานใน แต่ละโครงการ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการ จัดทำร่าง ข้อเสนอ โครงการวิจัย และ/หรือ กำหนดแนวทาง ในการพัฒนา งานวิชาการ	2. ประสานกอง/ ศูนย์/กลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัยและ งานวิชาการที่ต้อง ดำเนินการใน แต่ละปีให้แจ้ง รายชื่อคณะทำงาน ในแต่ละโครงการ	66.67	มีการ เปลี่ยนแปลง รายชื่อ คณะทำงาน ในแต่ละ โครงการอยู่ บ่อยครั้ง ประกอบกับ หลักเกณฑ์ การดำเนินการ โครงการวิจัย และพัฒนา วิชาการยังไม่ มีความชัดเจน
2	การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 แผน/8 ขั้นตอน)	2. จัดทำร่าง แผนพัฒนา บุคลากรฯ เสนอ ลปง. ลงนามให้ ความเห็นชอบ	1. รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	50.00	มีโครงการ นอกแผนและ เร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริม จริยธรรมและสร้าง จิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/200 คน)	1 ครั้ง/200 คน	อยู่ระหว่างการ ประสานนัดหมาย ลปง. กำหนดวันจัด โครงการฯ	-	ผู้บริหารมี ภารกิจจำนวนมาก จึงไม่ สามารถ กำหนดจัด โครงการฯ ได้ ตามแผนที่ วางไว้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
4	ค่าจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลตามแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการประเมิน 1 ฉบับ)	ทำสัญญา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้างฯ	-	เนื่องจากมี กระบวนการ ในการ ดำเนินการ หลายขั้นตอน
<b>กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน)</b>					
1	กิจกรรมบริหารจัดการ ทรัพย์สิน - งานสำรวจและ ตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ ตามกฎหมาย ปปง. (15 ครั้ง)	4 ครั้ง	3 ครั้ง	75.00	ขึ้นอยู่กับ ปริมาณคดีที่ บส. ได้รับจาก พนง.จนท. ประกอบกับ ทรัพย์สินมี ปริมาณ/ มูลค่าน้อย จึงไม่มีความ จำเป็นต้อง เดินทางไป สำรวจ
<b>กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)</b>					
1	โครงการ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง. - จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์	2 ครั้ง (ผลิตข่าว 1 นาที/ชื่อเวลา เผยแพร่ข่าวทาง โทรทัศน์)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้างฯ	-	การ ดำเนินการจัด จ้างมีหลาย ขั้นตอน จึงทำ ให้การ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ฐ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	ผ่านสื่อมวลชน ประเภทต่าง ๆ (128 ครั้ง)				แผน โดยจะมี การพิจารณา ผลการยื่นซอง วันที่ 26 ม.ค. 61
2	โครงการเผยแพร่ ความรู้กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง (18 ครั้ง/ร้อยละ 96)	8 ครั้ง/ ร้อยละ 96	7 ครั้ง/ร้อยละ 97.94	87.50	ในช่วงเดือน ต.ค. 60 หลาย หน่วยงานต้อง จัดเตรียมงาน พระราชพิธี ถวายพระ เพลิงพระบรม ศพ ร.9 จึงทำ ให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน

### 3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ๕.ค. 60	ปัญหา/อุปสรรค
<b>สำนักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ในส่วนกลางและภูมิภาค (1 โครงการ/ระดับ 5) (รจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย)	ระดับ 1 (เสนอขออนุมัติโครงการ ปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงาน ปปง. ใน ส่วนกลางและภูมิภาค)	รจัดสรรงบประมาณ เหลือจ่าย
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>			
1	งานดำเนินการคุ้มครองพยาน (ร้อยละ 70)	ร้อยละ 70	ไม่มีผู้ร้องขอให้ คุ้มครองช่วยเหลือฯ
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)</b>			
1	การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย (โครงการจัดทำข้อมูลรายงาน การทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน) (830 แห่ง/ร้อยละ 74)	ร้อยละ 74	รอความชัดเจนในการ ดำเนินการ เนื่องจากมี นโยบายในการ ปรับเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินการ ซึ่งอาจจะ ดำเนินการเอง
<b>กองคดี 3 (1 แผนงาน)</b>			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับ ผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ไม่มีผู้เสียหายร้องขอให้ คุ้มครองสิทธิฯ
<b>กองคดี 4 (1 แผนงาน)</b>			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับ ผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ไม่มีผู้เสียหายร้องขอให้ คุ้มครองสิทธิฯ
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้าน AML/CFT ในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2561 (1 ครั้ง/ระดับ 5)	1 ครั้ง/ระดับ 5	เจ้าหน้าที่มีภารกิจ หลายด้าน จึงยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 60	ปัญหา/อุปสรรค
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)</b>			
1	การตรวจพิสูจน์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละความสำเร็จของการตรวจพิสูจน์หลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ : ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ไม่มีเรื่องจากหน่วยงาน ภายในให้ดำเนินการ ตรวจพิสูจน์

### 3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
1	แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ปปง. (ศปท.) (1 แผน)	1 แผน (ต.ค. - พ.ย. 60)	1 แผน (ธ.ค. 60 - ม.ค. 61)	หนังสือที่ ปง 0001.2/2471 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 60
2	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน)	1 แผน (ต.ค. - พ.ย. 60)	1 แผน (ธ.ค. 60 - ม.ค. 61)	
